

Time'EATS

SUPERVISER LE PORTEFEUILLE PROJETS DE LA DSI ET SA MISE EN ŒUVRE

Contenu complet du support de présentation — Projet Expérientiel Collaboratif

Groupe	Cellule PMO — DSI Time'Eats — [Prénoms NOM des membres du groupe]
Destinataires (simulation)	Direction Générale — Comité de pilotage (COPIL) SI
Projet approfondi (Parties 2 et 3)	Mise en place de l'authentification forte des utilisateurs internes
Référence	PMO-TE-COLLAB-2026 — V1.0

Ce document rassemble, diapositive par diapositive, l'intégralité du contenu prévu pour le support PowerPoint du projet collaboratif — sommaire, tableaux et figures compris. Il peut servir de trame de présentation ou être transmis à un outil de mise en forme graphique pour produire le fichier .pptx final.

Sommaire

Ce que le support présente.....	4
Time'Eats et la mission confiée à la cellule PMO.....	4
Définir, prioriser et faire vivre le portefeuille de projets.....	6
Harmoniser le processus de management des projets.....	6
Le référentiel documentaire commun.....	6
Rubriques clés de trois documents pivots.....	7
Le tableau de bord de supervision du portefeuille.....	8
Application de la grille aux 11 projets du portefeuille.....	9
Superviser et conduire le projet sélectionné.....	10
Authentification forte des utilisateurs internes.....	10
Charte de projet et cahier des charges.....	10
Budget prévisionnel et planning.....	11
Registre des risques du projet.....	11
Plan de communication du projet.....	12
Tableau de bord de suivi — respect du triangle d'or.....	12
Clôre le projet.....	14
Documents contractuels de clôture.....	14
Template de procès-verbal de recette.....	14
Capitaliser l'expérience.....	15
Le processus de capitalisation d'expérience.....	15
Fiche de capitalisation — modèle générique.....	15
Synthèse, organisation et bilan.....	17
Ce que la Direction retient.....	17
Organisation du groupe et bilan.....	17
Merci de votre attention.....	18

Table des tableaux

Tableau 1 — Le référentiel documentaire (socle de cadrage).....	7
Tableau 2 — Le référentiel documentaire (pilotage et clôture).....	7
Tableau 3 — Critères de priorisation et cotation.....	8
Tableau 4 — Classement des 11 projets du portefeuille.....	9
Tableau 5 — Budget prévisionnel du projet (150 k€).....	11
Tableau 6 — Planning prévisionnel (juillet à octobre N).....	11
Tableau 7 — Registre des risques du projet Authentification forte.....	11
Tableau 8 — Plan de communication du projet.....	12
Tableau 9 — Tableau de bord de suivi du projet.....	13
Tableau 10 — Documents contractuels de clôture.....	14
Tableau 11 — Template de PV de recette.....	14
Tableau 12 — Fiche de capitalisation — modèle générique.....	15

Table des figures

Figure 1 — Cycle de vie commun en 6 phases.....	6
Figure 2 — Le dispositif de capitalisation et sa boucle d'amélioration.....	15

Guide de lecture — correspondance avec la grille d'évaluation

Pour faciliter la correction, chaque critère de la grille d'évaluation du travail collectif est relié ici aux diapositives qui y répondent.

Correspondance grille d'évaluation — diapositives

Thème	Critère	Pts	Diapositive(s)
Définir, prioriser, faire vivre le portefeuille	Le processus de management des projets s'appuie sur des référentiels standards	2	5
	Le plan du référentiel documentaire commun est détaillé, les rubriques clés sont expliquées	3	6-7
	Le tableau de bord de supervision inclut les critères de priorisation et leur cotation	3	8-9
Superviser et conduire les projets IT	Le plan de management du projet sélectionné couvre charte, CDC, budget, planning, risques, communication	3	11-15
	Le tableau de bord de suivi du projet permet de vérifier le respect du triangle d'or	2	16
Clôre les projets et capitaliser l'expérience	Les documents contractuels de clôture sont listés, un template de PV de recette est fourni	2	18-19
	Le processus d'amélioration est présenté et permet d'identifier des améliorations concrètes	3	21-22
Présentation orale	L'organisation du groupe et un bilan (points forts / axes d'amélioration) sont présentés	1	24
	La présentation est fluide, professionnelle et adaptée à un public IT	1	Ensemble du support

Barème collectif total : 20 points. S'y ajoute une notation individuelle sur 12 points, portée par la qualité des réponses de chacun pendant les 15 minutes de questions.

DIAPOSITIVE 2 • SOMMAIRE

Ce que le support présente

- 01 — Contexte et mission de la cellule PMO
- 02 — Définir, prioriser et faire vivre le portefeuille de projets
- 03 — Superviser et conduire le projet sélectionné : Authentification forte des utilisateurs internes
- 04 — Clôre le projet et capitaliser l'expérience
- 05 — Organisation du groupe et bilan

DIAPOSITIVE 3 • 01 • CONTEXTE

Time'Eats et la mission confiée à la cellule PMO

Time'Eats vend de la nourriture préparée et veut se lancer dans la livraison à domicile, en s'appuyant sur un réseau de traiteurs et de chefs partenaires. L'ambition affichée par la Direction est claire : un million de nouveaux clients et dix mille restaurants ou traiteurs partenaires en deux ans, avec l'idée de devenir

un acteur reconnu en France à cinq ans (plus de 25 % de part de marché), sans chercher à concurrencer directement les grandes plateformes internationales sur leur terrain.

Pour tenir ce rythme, la DSI doit livrer beaucoup en peu de temps : application web, applications mobiles, CRM, sécurité renforcée... Onze projets sont aujourd'hui lancés ou à lancer sur l'année, pilotés par une cellule PMO de cinq chefs de projet tout juste créée — plus d'un projet par chef de projet, sans compter le temps que chacun doit aussi consacrer au pilotage transverse du portefeuille. Sans méthode commune, ce volume devient vite intenable ; c'est pour cela que la Direction nous a demandé de structurer le pilotage du portefeuille avant qu'un projet n'échoue faute d'organisation.

Ce dossier suit les quatre parties demandées : définir et prioriser le portefeuille, conduire un projet précis de bout en bout, le clore proprement, puis capitaliser sur ce qui en a été appris. Le projet approfondi en Parties 2 et 3, l'authentification forte des utilisateurs internes, est imposé à tous les groupes pour cet exercice. Nous montrons en Partie 1.3 qu'il se classe de toute façon parmi les projets prioritaires du portefeuille, ce qui confirme que ce choix n'a rien d'arbitraire.

Le budget détaillé, le registre des risques et les indicateurs de suivi présentés en Partie 2 vont au-delà des seuls chiffres globaux donnés par le contexte (budget total, durée, dates) : nous les avons complétés pour illustrer la méthode, sans changer les données d'entrée du portefeuille utilisées en Partie 1.

200 salariés dans l'entreprise

21 collaborateurs à la DSI

11 projets dans le portefeuille DSI

25 % de part de marché visée à 5 ans

PARTIE 1

Définir, prioriser et faire vivre le portefeuille de projets

DIAPOSITIVE 5 • PARTIE 1 • 1.1

Harmoniser le processus de management des projets

Avant la cellule PMO, chaque chef de projet gérait son projet à sa manière, avec des documents qui changeaient de forme d'un projet à l'autre. Nous retenons une trame commune, construite à partir de trois référentiels reconnus, adaptée à la taille des projets de Time'Eats plutôt qu'appliquée à la lettre.




Figure 1 — Cycle de vie commun en 6 phases

PMI (PMBOK)

sert d'ossature : découpage en phases et rubriques du plan de management (charte, budget, planning, risques).

PRINCE2

inspire la gouvernance : un comité valide chaque jalon avant de passer à la phase suivante (logique de « Go / No-Go »).

Agile (Scrum)

s'applique pendant la réalisation des projets applicatifs (CRM, applis mobiles, refonte web), par sprints courts.

Un projet d'infrastructure (sauvegarde Cloud, stockage) suit la même trame, mais sans les sprints Agile : la phase de réalisation y est traitée en une seule fois, sans découpage itératif. Le niveau de détail varie aussi d'un projet à l'autre — un projet d'infrastructure simple n'a pas besoin d'un cahier des charges aussi étoffé qu'une application mobile.

DIAPOSITIVE 6 • PARTIE 1 • 1.2

Le référentiel documentaire commun

Dix documents types couvrent l'ensemble du cycle de vie d'un projet IT, du cadrage à la capitalisation. Chaque document dispose d'un modèle à dupliquer par les équipes projets, dans le respect de la charte graphique Time'Eats.

Tableau 1 — Le référentiel documentaire (socle de cadrage)

Document	Objectif	Moment
Charte de projet	Formaliser l'accord de lancement	Cadrage
Cahier des charges	Détailler les exigences à respecter	Cadrage / conception
Budget prévisionnel	Décomposer et justifier l'enveloppe	Lancement, mis à jour à chaque jalon
Planning prévisionnel	Séquencer phases et jalons	Lancement, suivi hebdomadaire
Registre des risques	Identifier, coter, traiter les risques	Tout au long du projet

Tableau 2 — Le référentiel documentaire (pilotage et clôture)

Document	Objectif	Moment
Plan de communication	Organiser messages, canaux, fréquences	Lancement, utilisé en continu
Tableau de bord de suivi	Piloter avancement, budget, qualité	En continu
Procès-verbal de recette	Acter la conformité des livrables	Clôture / mise en production
Document de clôture	Bilan administratif, contractuel, technique	Clôture
Fiche de capitalisation (REX)	Consigner les enseignements	Clôture

Les cinq premiers documents forment le socle minimal pour lancer tout projet DSI ; les cinq suivants accompagnent le pilotage et la clôture, présentés en Parties 2 et 3 avec le projet Authentification forte. Avant ce référentiel, deux chefs de projet pouvaient présenter un budget prévisionnel sous deux formes différentes en comité de pilotage, ce qui obligeait à reformuler les chiffres à chaque fois pour pouvoir les comparer. Avec les mêmes rubriques d'un projet à l'autre, la Direction peut se concentrer sur le fond plutôt que sur la forme.

DIAPOSITIVE 7 • PARTIE 1 • 1.2

Rubriques clés de trois documents pivots

Le formalisme complet de chaque document est laissé au chef de projet ; trois documents structurent tout le reste et méritent d'être détaillés.

1. Charte de projet (1 page — accord de lancement)

Objectif et périmètre — Sponsor et chef de projet — Budget et planning cadres — Critères de succès.

2. Cahier des charges (7 rubriques)

Contexte et objectifs — Exigences fonctionnelles — Exigences non fonctionnelles — Contraintes et interfaces — Livrables attendus — Critères d'acceptation — Annexes.

3. Registre des risques (ouvert au lancement, mis à jour à chaque comité)

Identifiant et catégorie — Probabilité × impact = criticité — Stratégie de traitement — Plan d'action et responsable.

Ce référentiel commun facilite aussi l'arrivée d'un nouveau chef de projet dans la cellule PMO : plutôt que d'apprendre les habitudes de chacun, il retrouve directement les mêmes documents et la même logique d'un projet à l'autre.

Le tableau de bord de supervision du portefeuille

La priorisation du portefeuille doit suivre la stratégie de l'entreprise plutôt que des impressions personnelles : c'est ce qui permet d'expliquer simplement pourquoi un projet passe devant un autre lorsque la Direction doit arbitrer. Time'Eats veut grandir vite sur la livraison, avec le digital comme moteur, tout en respectant ses obligations légales et en gardant un système d'information qui tient la route. Nous en tirons cinq axes :

- Axe 1 — Conquérir de nouveaux clients : les projets côté client (applications mobiles, CRM, refonte du site) portent l'objectif du million de nouveaux clients.
- Axe 2 — Construire un socle technique fiable : les projets d'infrastructure et de sécurité (authentification forte, sauvegarde Cloud, migration Azure) préparent le SI à la croissance.
- Axe 3 — Limiter les risques et garder l'activité en marche : sauvegarde et stockage protègent contre la perte de données, un sujet qui pèsera de plus en plus lourd avec le volume de clients à venir.
- Axe 4 — Respecter la réglementation : la mise à jour des outils de paie n'est pas négociable, elle conditionne le paiement des salaires.
- Axe 5 — Maîtriser les coûts et donner de la visibilité à la Direction : c'est le rôle même de la cellule PMO.

Le contexte transmis par la DSI note déjà chaque projet sur trois points, de 1 à 5, directement reliés à ces axes. Plutôt que d'en inventer d'autres, nous reprenons ces trois notes et nous les additionnons :

Tableau 3 — Critères de priorisation et cotation

Critère	Ce qu'il mesure	Échelle de cotation
Nécessité stratégique	Importance du projet pour la stratégie de Time'Eats (voir les 5 axes ci-dessus)	1 (marginal) à 5 (indispensable) — un projet réglementaire est toujours coté 5
Rentabilité attendue	Retour attendu : nouveaux clients, chiffre d'affaires, économies réalisées	1 (faible) à 5 (fort)
Maîtrise des risques	Confiance de l'équipe projet dans sa capacité à tenir le projet	1 (risques mal maîtrisés) à 5 (risques bien maîtrisés)

Nous avons gardé ces trois critères parce qu'ils étaient déjà dans les données transmises par la Direction, et parce qu'ils reprennent les questions qu'on se pose toujours face à un projet : est-ce important, est-ce que ça rapporte, et quels sont les risques. Un quatrième critère de complexité technique aurait surtout compliqué la grille sans vraiment changer le classement des projets.

Score = Nécessité + Rentabilité + Maîtrise des risques (sur 15). Plus le score est élevé, plus le projet est prioritaire.

Priorité 1 — Engagé (score ≥ 12) • Priorité 2 — Important (score 9 à 11) • Priorité 3 — À surveiller (score ≤ 8)

Exception assumée : un projet réglementaire reste engagé quel que soit son score — c'est le cas de la mise à jour des outils de paie.

Le formalisme du tableau de bord (couleurs, mise en page) est laissé à l'appréciation de chaque équipe ; seule la logique de cotation ci-dessus est commune à tout le portefeuille.

Application de la grille aux 11 projets du portefeuille

Tableau 4 — Classement des 11 projets du portefeuille

Rang	Projet	Néc.	Rent.	M.R.	Score /15	Priorité
1=	Application mobile clients	5	5	3	13	P1
1=	Sauvegarde Cloud	5	3	5	13	P1
3=	Mise en place d'un CRM	5	3	4	12	P1
3=	Application mobile fournisseurs	5	5	2	12	P1
3=	Refonte de l'application web	5	5	2	12	P1
3=	Authentification forte des utilisateurs internes	5	3	4	12	P1
7=	MAJ réglementaire des outils de paie *	5	1	4	10	P2
7=	Stockage / gestion des fichiers	4	3	3	10	P2
9=	Mise en place d'Office 365	4	2	3	9	P2
9=	Plateforme de livraison continue	3	3	3	9	P2
11	Migration MS Azure des applications métiers	3	4	1	8	P3

Quatre projets se retrouvent à égalité à 12 points, mais avec deux profils différents : le CRM et l'authentification forte misent sur une bonne maîtrise des risques (4/5) avec une rentabilité plus mesurée, tandis que l'application mobile fournisseurs et la refonte du site web offrent une rentabilité plus forte (5/5) au prix d'une maîtrise des risques moins bonne (2/5).

* *Projet réglementaire : engagé quel que soit son score. Sur les scores à égalité, nous regardons ensuite si les projets se chevauchent dans le temps : l'authentification forte (juillet) et la sauvegarde Cloud (octobre) ne se chevauchent pas, par exemple, donc pas de conflit de ressources à arbitrer entre les deux. L'authentification forte se classe en tout cas en Priorité 1 (rang 3 sur 11), ce qui confirme la pertinence du projet imposé pour cet exercice.*

Superviser et conduire le projet sélectionné

DIAPOSITIVE 11 • PARTIE 2 • PRÉSENTATION

Authentification forte des utilisateurs internes

Intégrer une solution d'authentification multi-facteurs (MFA) pour renforcer la sécurité des accès aux applications internes et tierces de Time'Eats, et protéger les données sensibles contre les accès non autorisés. Le projet concerne l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, tous sites confondus.

150 k€ Budget prévisionnel

4 mois Juillet → Octobre N

120 j/h Charge de travail estimée

12/15 — P1 Score et priorité dans le portefeuille (rang 3 sur 11)

Pourquoi ce projet a été retenu :

Le sujet impose ce projet à tous les groupes pour cet exercice. Ce n'est pas qu'une contrainte arbitraire : nous montrons en Partie 1.3 qu'il se classe en Priorité 1 du portefeuille, avec un profil proche de celui du CRM (nécessité forte, rentabilité mesurée, risques plutôt bien maîtrisés). Avec la montée en puissance du CRM et des applications mobiles dans les mois qui suivent, sécuriser les accès aux données clients et fournisseurs est une base qu'il vaut mieux avoir posée en amont plutôt que rattrapée après coup.

DIAPOSITIVE 12 • PARTIE 2 • 2.1 PLAN DE MANAGEMENT (1/3)

Charte de projet et cahier des charges

Les consignes excluent un plan de management complet pour ce projet : nous nous concentrons donc sur l'intérêt de chaque rubrique et ses éléments clés, sans détailler chaque champ.

Charte — Objectif

Sécuriser l'accès aux applications internes et tierces par une authentification à plusieurs facteurs

Charte — Périmètre

Tous les collaborateurs Time'Eats, tous sites (Rennes, Morlaix, Concarneau, bureaux régionaux)

Charte — Cadre budget / délai

150 k€ — 4 mois (juillet à octobre N)

Charte — Sponsor

Directeur des Systèmes d'Information (RSSI)

Charte — Critère de succès

MFA actif sur 100 % des comptes à risque fin octobre, sans interruption de service majeure

CDC — Exigences fonctionnelles

Au moins 2 méthodes MFA au choix (application d'authentification, notification push), auto-inscription guidée, SSO avec l'AD existant

CDC — Exigences non fonctionnelles

Disponibilité du service $\geq 99,5\%$, compatibilité avec les applications tierces, accessible à tous les profils (terrain, siège, production)

CDC — Livrables attendus

Solution MFA déployée, guide utilisateur, procédure de support

CDC — Critères d'acceptation

Base du plan de test — voir Partie 3 (clôture)

DIAPOSITIVE 13 • PARTIE 2 • 2.1 PLAN DE MANAGEMENT (2/3)

Budget prévisionnel et planning

Tableau 5 — Budget prévisionnel du projet (150 k€)

Poste de dépense	Montant	Commentaire
Solution MFA (licences)	40 k€	Pour l'ensemble des collaborateurs
Intégration (prestation ESN)	55 k€	Interfaçage AD + applications tierces
Ressources internes	25 k€	Équipe infrastructure mobilisée
Formation & communication	15 k€	Supports, sessions, renfort helpdesk
Provision pour aléas	15 k€	Couvre le registre des risques
Total	150 k€	Validé dans la charte de projet

Tableau 6 — Planning prévisionnel (juillet à octobre N)

Phase	Période	Jalon
Cadrage & lancement	Juillet (S1-S2)	Charte validée
Choix solution & conception	Juillet (S3-S4)	Dossier de conception validé
Paramétrage & intégration	Août – mi-septembre	Intégration AD terminée
Pilote (site de Rennes)	Mi-septembre	Retour du pilote, ajustements
Déploiement généralisé	Fin sept. – mi-octobre	Bascule de tous les sites
Recette & clôture	Fin octobre	PV de recette signé

Nous avons réparti le budget entre ressources internes et prestation externe selon les compétences déjà présentes à la DSI : l'intégration technique pointue (AD, applications tierces) est confiée à un prestataire, la formation reste portée en interne, là où l'équipe connaît mieux le contexte de Time'Eats.

DIAPOSITIVE 14 • PARTIE 2 • 2.1 PLAN DE MANAGEMENT (3/3)

Registre des risques du projet

Probabilité $\times$ impact = criticité (échelle 1 à 5). Le registre est ouvert au lancement et mis à jour à chaque comité de pilotage.

Tableau 7 — Registre des risques du projet Authentification forte

ID	Risque	Catégorie	P	I	Crit.	Plan d'action
R-01	Résistance au changement chez les	Organisation	4	3	12	Communication anticipée et relais de proximité sur chaque

	utilisateurs les moins à l'aise avec le numérique	nel				site
R-02	Perte du moyen d'authentification, accès bloqué	Humain	3	4	12	Codes de secours et procédure de récupération encadrée par le support
R-03	Dépendance au prestataire pour l'intégration technique	Fournisseur	2	4	8	Clause de réversibilité et documentation technique exigées au contrat
R-04	Applications tierces incompatibles avec le protocole retenu	Technique	3	3	9	Audit de compatibilité dès le cadrage, plan de contournement si besoin
R-05	Interruption d'accès pendant la bascule d'un site	Technique	2	5	10	Bascule progressive, fenêtre annoncée, support renforcé le jour J

R-01 et R-02 sont les plus critiques (score 12) : ils touchent directement l'expérience des utilisateurs, cible principale du plan de communication.

DIAPOSITIVE 15 • PARTIE 2 • PLAN DE MANAGEMENT

Plan de communication du projet

L'intensité de la communication augmente à l'approche de chaque bascule de site, pour limiter le risque R-01 (résistance au changement).

Tableau 8 — Plan de communication du projet

Cible	Objectif	Message clé	Canal	Fréquence
Direction / RSSI	Rendre compte de l'avancement et des risques	Avancement, budget, arbitrages nécessaires	Comité de pilotage	Mensuel
Managers de site	Préparer et relayer le déploiement	Calendrier de bascule, actions attendues	Réunion + email	Toutes les 2 semaines
Ensemble des collaborateurs	Informar, rassurer, accompagner	Pourquoi ce projet, comment s'inscrire, où trouver de l'aide	Intranet, affichage, mailing	Hebdomadaire pendant le déploiement
Site pilote (Rennes)	Tester et remonter les difficultés	Consignes de test, canal de remontée	Canal dédié	Quotidien pendant le pilote

Le canal compte parfois plus que le message : les équipes de production, moins connectées à leur messagerie pendant leur poste, réagissent mieux à un relais de proximité qu'à un simple email.

DIAPOSITIVE 16 • PARTIE 2 • 2.2

Tableau de bord de suivi — respect du triangle d'or

Cinq indicateurs, suivis chaque semaine par le chef de projet et présentés en comité de pilotage, couvrent les coûts, les délais et la qualité.

Tableau 9 — Tableau de bord de suivi du projet

Indicateur	Mode de calcul	Cible	Fréquence
Avancement planning (délai)	Jalons atteints à date / jalons prévus à date	Écart théorique / réel < 10 %	Hebdomadaire
Consommation budgétaire (coût)	Budget engagé / budget prévisionnel	Alignée sur l'avancement ($\pm 10\%$)	Hebdomadaire
Taux de couverture MFA (qualité)	Comptes protégés / comptes à protéger	100 % avant clôture	Hebdomadaire
Taux d'incidents d'accès (qualité)	Tickets « blocage d'accès » ouverts / semaine	Décroissant après S2 du déploiement	Hebdomadaire
Complétion des formations (qualité)	Collaborateurs formés / à former	100 % avant bascule de chaque site	Hebdomadaire

Les trois derniers indicateurs traduisent la qualité du déploiement du point de vue de l'utilisateur, plutôt qu'un simple respect du cahier des charges technique.

PARTIE 3

Clore le projet

DIAPOSITIVE 18 • PARTIE 3 • 3.1

Documents contractuels de clôture

Il ne s'agit pas de formaliser entièrement chaque document, mais de justifier pourquoi chacun est nécessaire pour clore proprement le projet, en interne comme avec le prestataire.

Tableau 10 — Documents contractuels de clôture

Document	Concerne	Pourquoi il est nécessaire
PV de recette	Interne + prestataire	Acter que la solution livrée répond au cahier des charges avant la mise en production
PV de réception / levée des réserves	Prestataire (ESN)	Constater la correction des anomalies relevées en recette et déclencher le solde du paiement
Facture soldée	Prestataire (ESN)	Justifier la clôture financière du marché auprès de la comptabilité
Dossier d'exploitation & documentation technique	Interne	Permettre à l'équipe infrastructure de reprendre la solution en exploitation courante
Clause de réversibilité / restitution des accès	Prestataire (ESN)	Garantir que Time'Eats récupère l'ensemble des accès et paramétrages à la fin du contrat
Fiche de clôture de projet	Interne (PMO)	Consolider le bilan administratif, budgétaire et technique du projet pour la Direction

DIAPOSITIVE 19 • PARTIE 3 • 3.2

Template de procès-verbal de recette

Modèle unique, pensé pour être réutilisé par tous les projets du portefeuille DSI, qu'ils soient applicatifs ou d'infrastructure.

Tableau 11 — Template de PV de recette

Champ	Contenu attendu
Projet	Nom du projet concerné
Date de la recette	Date de la séance de recette
Participants	Chef de projet, RSSI, référents métier, sponsor
Périmètre testé	Scénarios couverts, référencés au plan de test / cahier des charges
Nombre de tests exécutés	Total exécuté / total prévu
Résultats	Tests conformes / non conformes / avec réserve
Anomalies ouvertes à la signature	Liste, criticité, plan de correction
Décision	Recette prononcée / avec réserves / refusée
Signatures	Chef de projet et sponsor (ou représentant métier mandaté)

PARTIE 4

Capitaliser l'expérience

DIAPOSITIVE 21 • PARTIE 4 • 4.1

Le processus de capitalisation d'expérience

1. Fiche de capitalisation (REX)

Modèle unique, complétée en fin de projet par le chef de projet et challengée par le PMO.

2. Rétrospective d'équipe


Format court « ce qui a bien fonctionné / ce qui peut être amélioré / actions », animée par le PMO à chaque clôture, avec tous les contributeurs.

3. Base de connaissances centralisée

Fiches REX, registres de risques clos et documents de clôture archivés sur un espace partagé du PMO, accessible à tous les chefs de projet.

4. Revue de portefeuille trimestrielle

Le PMO présente à la Direction une synthèse des enseignements des projets clos et propose, si besoin, une mise à jour du référentiel documentaire ou de la grille de priorisation.

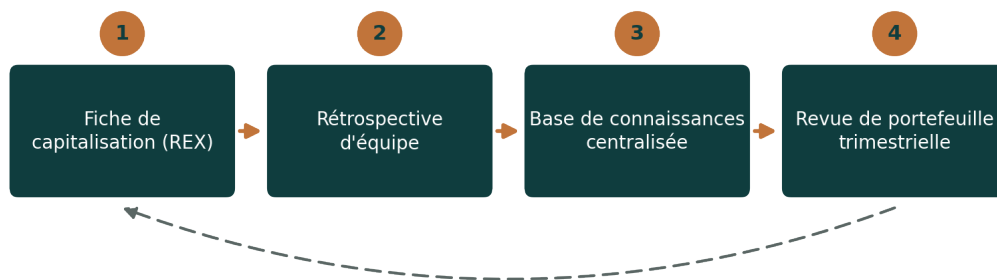

Met à jour le référentiel documentaire et la grille de priorisation (Partie 1)

Figure 2 — Le dispositif de capitalisation et sa boucle d'amélioration

Ces quatre outils se complètent.

- La fiche garde la trace individuelle d'un projet.
- La rétrospective permet d'en discuter à chaud, avant que les détails ne s'effacent.
- La base de connaissances la rend accessible aux projets suivants.
- La revue trimestrielle s'assure que ça change vraiment quelque chose dans la méthode, plutôt que de rester de bonnes intentions qu'on ne relit jamais.

DIAPOSITIVE 22 • PARTIE 4 • 4.2

Fiche de capitalisation — modèle générique

Tableau 12 — Fiche de capitalisation — modèle générique

Champ	Contenu attendu
Projet / Chef de projet	Identification du projet clos

Ce qui a bien fonctionné	Pratiques, outils ou décisions à reproduire
Ce qui peut être amélioré	Difficultés rencontrées, causes identifiées
Enseignement généralisable	Ce que ce projet apprend aux autres projets du portefeuille
Action sur le référentiel / la méthode	Mise à jour concrète proposée (modèle, processus, critère de priorisation)

Cette fiche sera complétée à la clôture réelle du projet Authentification forte, prévue fin octobre N. Les ajustements qui en ressortiront alimenteront directement le référentiel documentaire de la Partie 1, au bénéfice des dix autres projets du portefeuille qui restent à lancer.

Synthèse, organisation et bilan

DIAPOSITIVE 23 • CONCLUSION

Ce que la Direction retient

Ce dossier répond aux quatre parties demandées. Il met surtout en évidence une distinction utile pour la suite : ce qui a le plus de valeur pour Time'Eats n'est pas toujours ce qui doit être fait en premier. L'authentification forte en est un bon exemple, engagée moins pour sa rentabilité directe que parce qu'elle sécurise la base sur laquelle le CRM et les applications mobiles vont s'appuyer.

- Un référentiel documentaire commun et un outil de priorisation objectif pour piloter les 11 projets du portefeuille
- Une méthodologie de conduite de projet démontrée sur l'authentification forte, réutilisable pour les projets suivants
- Des outils de clôture et de capitalisation qui garantissent que les enseignements d'un projet profitent aux suivants

Demande au COPIL : valider l'usage systématique de ce référentiel pour les prochains projets lancés par la DSI.

Time'Eats vise un million de nouveaux clients et dix mille partenaires en deux ans : un objectif qui n'est pas tenable si chaque chef de projet continue de gérer son projet à sa façon. La méthode présentée dans ce dossier n'a de sens que si elle sert cette ambition de croissance, pas l'inverse.

DIAPOSITIVE 24 • CONCLUSION

Organisation du groupe et bilan

Organisation retenue sur les 4 jours du projet collaboratif :

- J1 — cadrage du sujet, répartition des rôles, démarrage du référentiel et du tableau de bord de portefeuille
- J2 — finalisation de la Partie 1, construction du plan de management du projet (Partie 2)
- J3 — tableau de bord projet, documents de clôture, retour d'expérience (Parties 2 à 4)
- J4 — préparation et répétition de la soutenance

Points forts (à personnaliser par le groupe) :

- Un référentiel et une méthode de priorisation qui s'appliquent à tout le portefeuille, pas seulement au projet choisi
- Une répartition du travail selon les compétences de chacun, avec des points de synchronisation réguliers

Axes d'amélioration (à personnaliser par le groupe) :

- Documents contractuels volontairement listés sans être formalisés, comme demandé par les consignes — un point à approfondir si le temps le permet
- Tester le tableau de bord de suivi sur un deuxième projet du portefeuille pour vérifier sa robustesse

 Cette diapositive est à personnaliser impérativement par le groupe : noms des membres, répartition réelle du travail, et bilan sincère de ce qui s'est passé pendant les 4 jours.

Merci de votre attention

Place aux questions.
